

Sitzung des TAUUA am 11.10.2022

Darstellung der laufenden Baumaßnahmen



ALBSTADT
Leben. Weit über normal.

Inhalt

- > **Sachstand Baumaßnahmen**
- > 01. Neubau Brücke, Kleine Straße
- > 02. Restarbeiten an der Brücke Degerfeldstraße
- > 03. Kanalsanierung Gesamtstadtgebiet 2022
- > 04. Kanalsanierung Pfeffingen 2022
- > 05. Spielplatz mit Parkplatz, Ottmartialstraße Ebingen
- > 06. Erweiterung Urnenturm, Friedhof Laufen
- > 07. Erneuerung Friedhofseingang Ebingen + Wegesanieerung

- > 08. Vollausbau Lenaustraße & Teilstück Untere Bachstraße in A.- Tailfingen
- > 09. Kronenstraße in A.- Tailfingen
- > 10. Außenanlage Luther Schule Kindergarten in A.- Tailfingen
- > 11. Umgestaltung Außenanlage Luther Schule in A.- Tailfingen
- > 12. Treppenaufgang Dreherstraße in A.- Tailfingen
- > 13. Vollausbau Gotenstraße in A.- Lautlingen
- > 14. Vollausbau Eyachstraße in A.- Laufen
- > 15. Stützmauersanierung Von Stauffenberg Straße in A.- Lautlingen
- > 16. Vollausbau Schwalben- und Zeisigweg in A.- Tailfingen

- > 17. Erschließung Lichtenbol-Süd in A.-Tailfingen
- > 18. Ausbau Stadionstraße in A.-Tailfingen
- > 19. FTTB-Breitbandausbau der Schulen und Krankenhäuser



Neubau Brücke, Kleine Straße

Geplante Bauzeit:	20.06.-29.07.2022
Sachstand:	Der Auftrag wurde erteilt.
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	PSP:7.541163 HH 100.000,00 €
Kostenschätzung/- berechnung	Kostenschätzung 04/2022 87.000,00€
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 116.654,58 € Erteilte Aufträge : 116.654,58 € Bezahlte Rechnungen : noch keine



02. Restarbeiten an der Brücke, Degerfeldstraße



Restarbeiten an der Brücke, Degerfeldstraße


Geplante Bauzeit:	17.05.2021-30.09.2021
Sachstand:	<p>Die Einstellung der Arbeiten hat am 19.10.2021 erfolgt.</p> <p>Die Problematik mit der Höhenanpassung des Geländes an die Kappen ist gelöst.</p> <p>Ein Nachtragsangebot liegt vor. Die Nachtragsvereinbarung wurde unterschrieben.</p> <p>Seit Dezember 2021 ist die Brücke einspurig für den Autoverkehr als auch für Fußgänger offen.</p>
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	PSP: P 66541002+ Fördermittel
Kostenschätzung/- berechnung	Kostenschätzung 02/2020 535.000,00€
Aktueller Kostenstand:	<p>Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 388.001,57 €</p> <p>Erteilte Aufträge : 388.001,57 €</p> <p>Bezahlte Rechnungen : 296.477,59 €</p>



03. Kanalsanierung Gesamtstadtgebiet 2022



Kanalsanierung Gesamtstadtgebiet 2022

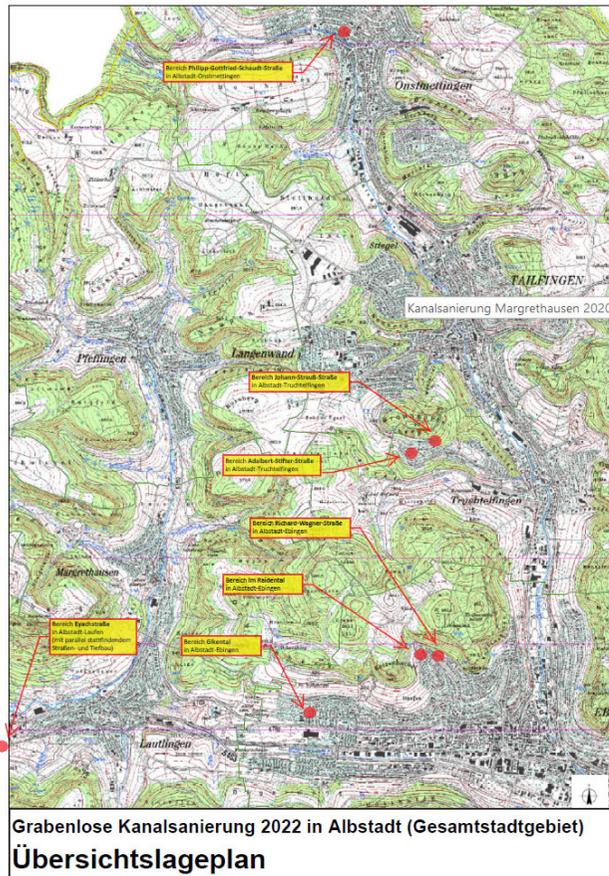

Die zu sanierenden Kanalhaltungen liegen in den folgenden Gebieten/Straßenabschnitten bzw. Ortsteilen:

- Im Raidental in Ebingen
- Richard-Wagner-Straße in Ebingen
- Im Gikental in Ebingen
- Johann-Strauß-Straße in Truchelfingen
- Adalbert-Stifter-Straße in Truchelfingen
- Ph.-Gottfried-Schaudt-Straße in Onstmettingen
- Eyachstraße in Lautlingen (mit parallel stattfindendem Straßen- und Tiefbau)

Kanalsanierung Gesamtstadtgebiet 2022

Geplante Bauzeit:	01.04.2022 – 04.11.2022
Sachstand:	<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag Fa. Aarsleff • Inliner eingebaut • Maßnahme größtenteils abgeschlossen
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	Die Finanzierung erfolgt konsumtiv über die Budgeteinheit „66 Ableitung von Abwasser“ Darin stehen ausreichend Mittel zur Verfügung
Kostenschätzung/- berechnung	Kostenschätzung 01/2022 296.000,00 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 296.000,00 € Erteilte Aufträge : 299.247,92 € Bezahlte Rechnungen : 199.000,00 €



04. Kanalsanierung Pfeffingen 2022



Kanalsanierung Pfeffingen 2022

Geplante Bauzeit:	11.05.2022 – 04.11.2022
Sachstand:	<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung über IB Langenbach • Auftrag Fa. Kanalexperthen Reitz • Inliner eingebaut • Maßnahme größtenteils abgeschlossen
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	Die Finanzierung erfolgt konsumtiv über die Budgeteinheit „66 Ableitung von Abwasser“ Darin stehen ausreichend Mittel zur Verfügung
Kostenschätzung/- berechnung	Kostenschätzung 01/2022 von IB Langenbach 265.000,00 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 265.000,00 € Erteilte Aufträge : 237.692,50 € Bezahlte Rechnungen : 197.000,00 €



05. Spielplatz mit Parkplatz, Ottmartialstraße Ebingen



Spielplatz mit Parkplatz, Ottmartialstraße Ebingen

Geplante Bauzeit:	17.3.2022 – ca. 5.7.2022
Sachstand:	fertig gestellt
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	Finanzierung über 68 - HH Mittel: 85.000 €
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung vom 19.3.2021: 73.000 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 73.000 € Erteilte Aufträge : 63.667,14 € Bezahlte Rechnungen : 61.244,37 €



06. Erweiterung Urnenturm, Friedhof Laufen



Erweiterung Urnenturm, Friedhof Laufen

Bauzeit:	28.9.2021 – ca. 21.10.2021
Sachstand:	<ul style="list-style-type: none"> • Spielflächen vorhanden • Spielgeräte eingebaut • Asphaltflächen und Entwässerung erstellt • Bepflanzung teilweise fertig gestellt
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	Finanzierung über 68 - HH Mittel: 70.000 €, Rest über Budget Tiefbau
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung vom 14.07.2021: 159.469,16 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 159.469,16 € Erteilte Aufträge : 162.617,07 € Bezahlte Rechnungen : 68.177,61 €



07. Erneuerung Friedhofseingang Ebingen + Wegesanierung



Erneuerung Friedhofseingang Ebingen + Wegesanierung

Geplante Bauzeit:	31.10.2021-31.06.2022, aber Verzögerungen bei Fa. Schöppler. Baubeginn voraussichtlich Ende Juni 2022
Sachstand:	Maßnahme beginnt in Kürze
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	Finanzierung über 68 - HH Mittel: 370.000 €, Rest über konsumtives Budget (Wegesanierung)
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung vom 15.06.2021: 470.000 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 470.000 € Erteilte Aufträge : 419,932,61 € Bezahlte Rechnungen : noch keine €



08. Vollausbau Lenaustraße & Teilstück Untere Bachstraße in A.- Tailfingen



Vollausbau Lenaustraße & Teilstück Untere Bachstraße in A.- Tailfingen

Geplante Bauzeit:	März – Mai 2022
Sachstand:	-Lenaustraße abgeschlossen -Teilstück Untere Bachstraße Restarbeiten
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	Finanzierung über Stabsstelle Sanierung Straße Kanal 80.000,00 € Rest über investives Budget Tiefbau
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung vom 15.11.2021: 318.684,53 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 318.684,53 € Erteilte Aufträge : 324.806,75 € Bezahlte Rechnungen : 149.018,21 €



09. Kronenstraße in A.- Tailfingen



Kronenstraße in A.- Tailfingen

Geplante Bauzeit:	2021-2022 (inkl. Hechinger Straße)
Sachstand:	Maßnahme abgeschlossen zu 99%
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	PSP: 7.541111 und 7.538111 HH: Budget Tiefbau
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung : 595.000,00 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 595.000,00 € Erteilte Aufträge : 1.699.273,67 € → Gesamtauftrag mit BA Hechinger Straße Bezahlte Rechnungen : 559.583,10 €



10. Außenanlage Luther Schule Kindergarten in A.-Tailfingen



Außenanlage Luther Schule Kindergarten in A.- Tailfingen

Geplante Bauzeit:	11.2021 (witterungsabhängig) – 05.2022
Sachstand:	abgeschlossen
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	Stehen keine HH zur Verfügung Deckung über Gesamtbudget Gebäudemanagement
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung vom 11.10.2021: 45.488,95 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 45.488,95 € Erteilte Aufträge : 54.793,55 € Bezahlte Rechnungen : noch keine €



11. Umgestaltung Außenanlage Luther Schule in A.-Tailfingen



Umgestaltung Außenanlage Luther Schule in A.- Tailfingen

Geplante Bauzeit:	bis Sommer 2021
Sachstand:	<ul style="list-style-type: none"> -Parkplatz abgeschlossen -Gehweg und Bushaltestelle abgeschlossen -Spielfeld abgeschlossen -Schulhof begonnen → Verzögerung durch Sanierung Lutherhalle
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	PSP: 7.546060 (270.000,00 €) 7.211050 (125.000,00 €) HH 2020: 276.000,00 € Budget Sanierung: 200.000,00 € (Parkplatz) Budget Tiefbau: 119.000,00 €
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung: 1.046.751,63 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 953.922,54 € Erteilte Aufträge : 953,922,54 € Bezahlte Rechnungen : 546.500,00 €

12. Treppenaufgang Dreherstraße in A.- Tailfingen



Treppenaufgang Dreherstraße und Erneuerung Kanalhaltung Wirkerstraße in A.- Tailfingen

Geplante Bauzeit:	05.2021-09.2021 (verschoben in 2022)
Sachstand:	-Kanalhaltung Wirkerstraße abgeschlossen -Kanal abgeschlossen Treppenaufgang -Verkabelung und Gehwegbau in Arbeit
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	7.538165 // 160.000,00 € 7.541165 // 130.000,00 € P66538000 // KH Wirkerstraße
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung vom 03.02.2021: 253.209,69 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 253.209,69 € Erteilte Aufträge : 218.192,49 € Bezahlte Rechnungen : 95.678,25 €

13. Vollausbau Gotenstraße in A.- Lautlingen



Vollausbau Gotenstraße in A.- Lautlingen

Geplante Bauzeit:	05-09.2021 04.2022 Deckschicht eingebaut
Sachstand:	abgeschlossen
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	Finanzierung über 66 - HH Mittel: 560.000,00 €
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung vom 18.02.2021: 441.353,23 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 441.353,23 € Erteilte Aufträge : 423.676,12 € Bezahlte Rechnungen : 388.599,25 €

14. Vollausbau Eyachstraße in A.- Laufen



Vollausbau Eyachstraße in A.- Laufen

Geplante Bauzeit:	06.2021-05.2022
Sachstand:	Deckschicht fehlt
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	Finanzierung über 66 - HH Mittel: 900.000,00 €
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung vom 17.03.2021: 818.000,00 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 818.000,00 € Erteilte Aufträge : 799.876,30 € Bezahlte Rechnungen : 700.247,81 €



Stützmauersanierung und Errichtung einer Fußgängerampel in der Von Stauffenberg Straße A.-Lautlingen

Geplante Bauzeit:	09-10.2022
Sachstand:	Maßnahme beginnt in Kürze
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	P66541000 HH zur Verfügung: 1.929.850,65 €
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung vom 19.05.2022 : 224.669,80 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 224.669,80 € Erteilte Aufträge : 255.986,85 € (noch nicht beauftragt) Bezahlte Rechnungen : noch keine €



16. Vollausbau Schwalben- und Zeisigweg in A.-Tailfingen



Vollausbau Schwalben- und Zeisigweg in A.- Tailfingen

Geplante Bauzeit:	14.06.2021-voraussichtlich Ende August 2022
Sachstand:	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 140 m Kanal im Schwalbenweg verlegt • Ca. 140 m Straßenbau Schwalbenweg bis zur Asphalttragschicht fertiggestellt • Z.Zt. Kanalisierung Zeisigweg
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	Finanzierung über 68 - HH Mittel: 920.000 €, Rest über konsumtives Budget (Wegesanierung)
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung vom 18.01.2021: 1.000.000 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 1.000.000 € Erteilte Aufträge : 921.293,97 € Bezahlte Rechnungen : 306.886,62 €



17. Erschließung Lichtenbol Süd in A.-Tailfingen



Erschließung Lichtenbol Süd in A.-Tailfingen

Geplante Bauzeit:	14.06.2021-voraussichtlich Ende August 2022
Sachstand:	Maßnahme beginnt in Kürze
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	Finanzierung über 68 - HH Mittel: 300.000 €, Rest über konsumtives Budget (Wegesanierung)
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung vom 16.02.2022: 825.000 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 825.000 € Erteilte Aufträge : 1.015.551,96 € Bezahlte Rechnungen : 0 €



18. Ausbau Stadionstraße in A.-Tailfingen



Ausbau Stadionstraße in A.-Tailfingen

Geplante Bauzeit:	05.09.2022-Nov 2023
Sachstand:	Veröffentlichung am 24. / 25.07.2022
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	Finanzierung über 68 - HH Mittel: 1.570.000 €
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung vom 20.06.2022: 1.500.000 €
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/Koschä./Kobe. : 1.500.000 € Erteilte Aufträge : 0 € Bezahlte Rechnungen : 0 €



19. FTTB-Breitbandausbau der Schulen und Krankenhäuser



FTTB-Breitbandausbau der Schulen und Krankenhäuser

Geplante Bauzeit:	2022-2023
Sachstand:	Maßnahme hat begonnen am 30.05.2022
Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	Finanzierung Auftragssumme 4.676.699,22 € netto Vom Bund 50% gefördert: 2.338.349,61 € netto Land BW fördert 80% des verbleibenden Eigenanteils: 1.870.679,69 € netto Der Eigenanteil beträgt somit: 467.669,92 € netto
Kostenschätzung/- berechnung:	Kostenschätzung : 4.147.096,50 € netto
Aktueller Kostenstand:	Mittelbedarf/ : 467.669,92 € netto Erteilte Aufträge : 4.676.699,22 € netto Bezahlte Rechnungen : noch keine



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

