Projektnummer: 311

Bauzeitenplan

Deckensanierung Gymnasium Ebingen

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Vorarbeiten**			
2	Ausbau Deckenleuchten	22at	Do, 27.07.17	Fr, 25.08.17
3	Ausbau Abgehängte Decken	27at	Do, 27.07.17	Fr, 01.09.17
4	Einbau Decken- und Leuchtenprovisorium	15at	Mo, 21.08.17	Fr, 08.09.17
5	Vorbereitungsarbeiten EDV-Installation	54at	Mo, 15.01.18	Do, 29.03.18
6	**1. Bauabschnitt**			
7	Abbruch-und Mauerarbeiten - Schächte	40at	Mo, 16.10.17	Mo, 11.12.17
8	HLS-und Elektroinstallation - Schächte	56at	Mo, 23.10.17	Fr, 12.01.18
9	Trockenbau Schächte	10at	Mo, 15.01.18	Fr, 26.01.18
10	EDV -Verkabelung Klassenräume	27at	Di, 03.04.18	Fr, 11.05.18
11	Elektroinstallation Decken	45at	Di, 03.04.18	Fr, 08.06.18
12	Abgehängte Decken	45at	Mo, 09.04.18	Do, 14.06.18
13	Elektroinstallation Leuchten	45at	Mi, 11.04.18	Mo, 18.06.18
14	**2. Bauabschnitt**			
15	Abbruch-und Mauerarbeiten - Schächte	32at	Di, 02.01.18	Mi, 14.02.18
16	HLS-und Elektroinstallation - Schächte	44at	Di, 02.01.18	Fr, 02.03.18
17	Trockenbau Schächte	10at	Mo, 05.03.18	Fr, 16.03.18
18	EDV-Verkabelung Klassenräume	28at	Mo, 14.05.18	Fr, 22.06.18
19	Elektroinstallation Decken	33at	Mo, 14.05.18	Fr, 29.06.18
20	Abgehängte Decken	33at	Di, 22.05.18	Fr, 06.07.18
21	Elektroinstallation Leuchten	32at	Mi, 23.05.18	Fr, 06.07.18
22	**3. Bauabschnitt**			
23	Abbruch-und Mauerarbeiten - Schächte	35at	Mo, 29.01.18	Fr, 16.03.18
24	HLS-und Elektroinstallation - Schächte	48at	Mo, 29.01.18	Fr, 06.04.18
25	Trockenbau Schächte	10at	Mo, 09.04.18	Fr, 20.04.18
26	EDV-Verkabelung Klassenräume	23at	Mo, 25.06.18	Mi, 25.07.18
27	Elektroinstallation Decken	23at	Mo, 25.06.18	Mi, 25.07.18
28	Abgehängte Decken	25at	Mo, 02.07.18	Fr, 03.08.18
29	Elektroinstallation Leuchten	23at	Mi, 04.07.18	Fr, 03.08.18
30	**4. Bauabschnitt**			
31	Trockenbau Flure - F30 Abschlüsse	33at	Mo, 12.03.18	Fr, 27.04.18
32	EDV- Verkabelung	23at	Do, 26.07.18	Mo, 27.08.18
33	Elektroinstallation Decken	27at	Do, 26.07.18	Fr, 31.08.18
34	Abgehängte Decken	20at	Mo, 06.08.18	Fr, 31.08.18
35	Malerarbeiten Flure	20at	Mo, 13.08.18	Fr, 07.09.18
36	Elektroinstallation Leuchten	18at	Mi, 15.08.18	Fr, 07.09.18
37	**5. Bauabschnitt**			
38	Trockenbau Sonderräume-Treppenhalle	33at	Mo, 26.03.18	Di, 15.05.18
39	EDV-Verkabelung	27at	Do, 26.07.18	Fr, 31.08.18
40	Elektroinstallation Decken	31at	Do, 26.07.18	Do, 06.09.18
41	Abgehängte Decken	59at	Mo, 06.08.18	Fr, 26.10.18
42	Malerarbeiten	36at	Do, 11.10.18	Fr, 30.11.18
43	Elektroinstallation Leuchten	55at	Do, 11.10.18	Mo, 31.12.18

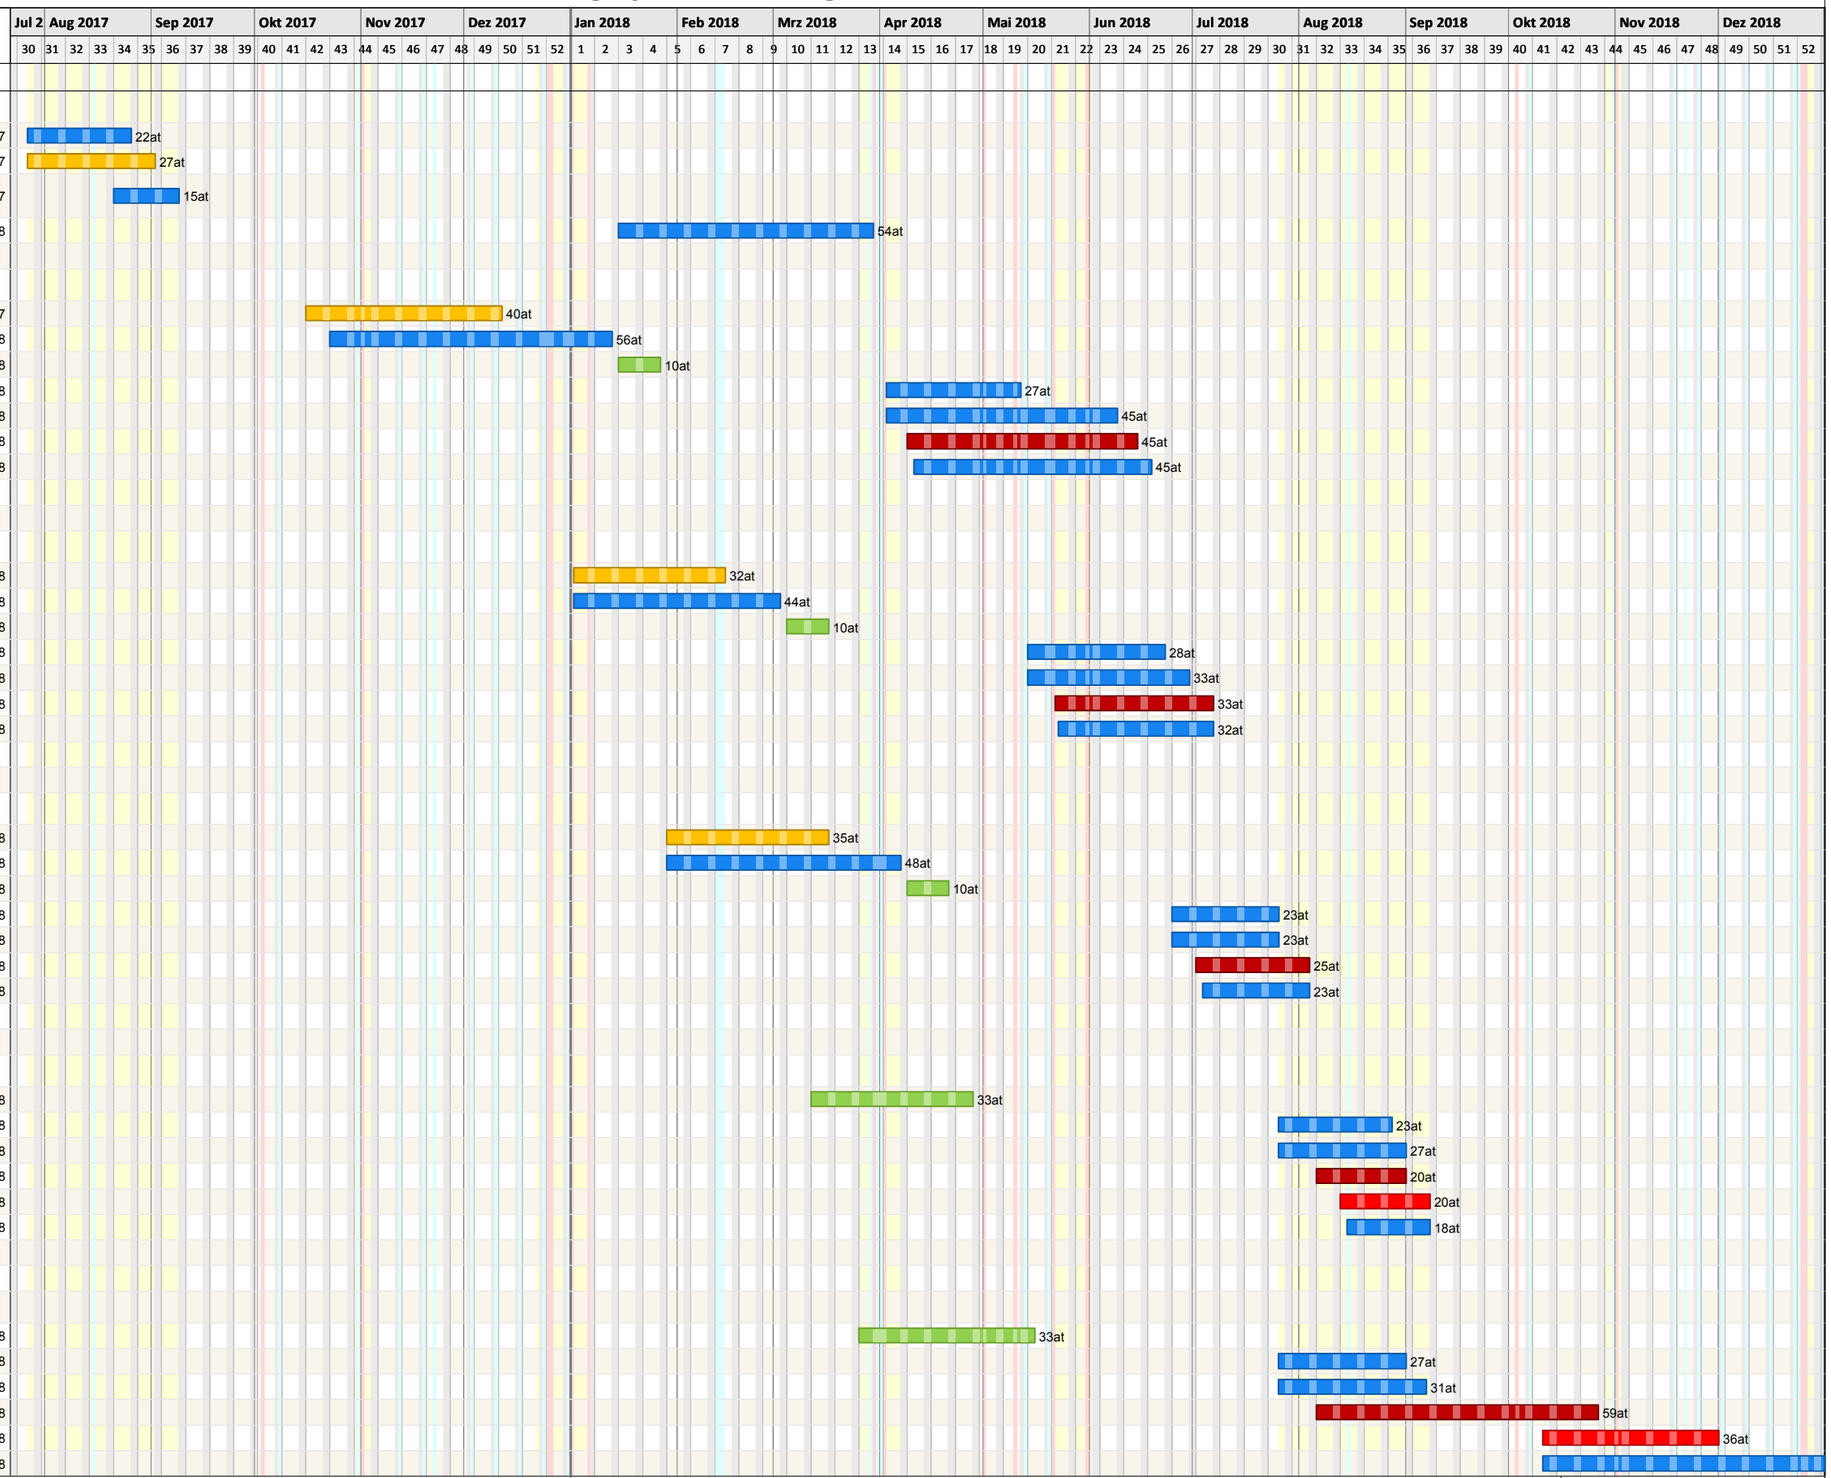

Haller
Lange Straße 3
D-72461 Albstadt
Tel. +49 7432 3554
Fax +49 7432 7990
e-Mail: haller-architekturbuero@t-online.de

erstellt mit pro-Plan 7 (7.00.7) Serien-Nr.: 1104 Lizenz für Haller, Albstadt
